



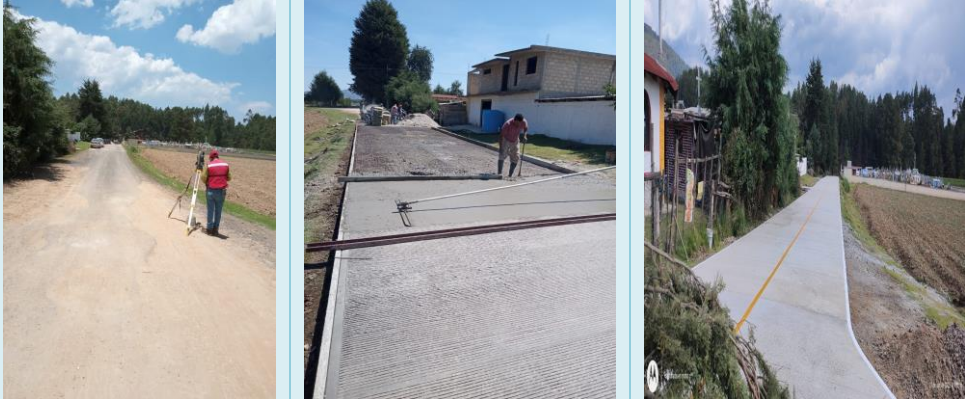
FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	10/07/2023								
Fecha de conclusión	29/08/2023								
Todo el municipio	Cabecera municipal								
Localidad (es)	Cabecera municipal								
Descripción	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Miguel Hidalgo hacia el río								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	1349								
Costo	\$999,848.76								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(X)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(X)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	20								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	10	9	10	0	
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									


FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	<i>Año fiscal (2023)</i>							
Fecha de inicio	<i>28/06/2023</i>							
Fecha de conclusión	<i>29/08/2023</i>							
Todo el municipio	<i>Agua bendita</i>							
Localidad (es)	<i>Agua bendita</i>							
Descripción	<i>Rehabilitación de sistema de agua potable</i>							
Meta	Incrementar el servicio de agua potable en localidades el Municipio							
Beneficiarios	650							
Costo	\$749,606.04							
Área responsable o ejecutora	<i>Dirección de Obras Públicas</i>							
Unidad de medida			Obra	(x)				
			Acción	()				
			Documento	()				
Tipo de Actividad	Compromiso		()					
	Demanda Social		()					
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()					
	Obra Pública en proceso		()					
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)					
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial ()	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()	
Línea de acción a vincular	<i>Incrementar el servicio de agua potable en localidades el Municipio</i>							
Avance Porcentual	100%							
Cantidad Programada anual	4							
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada
	0	0	0	0	2	2	2	2
Descripción del Avance	<i>Se realizaron trabajos de servicios básicos de agua potable en benéfico de la población</i>							
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)								

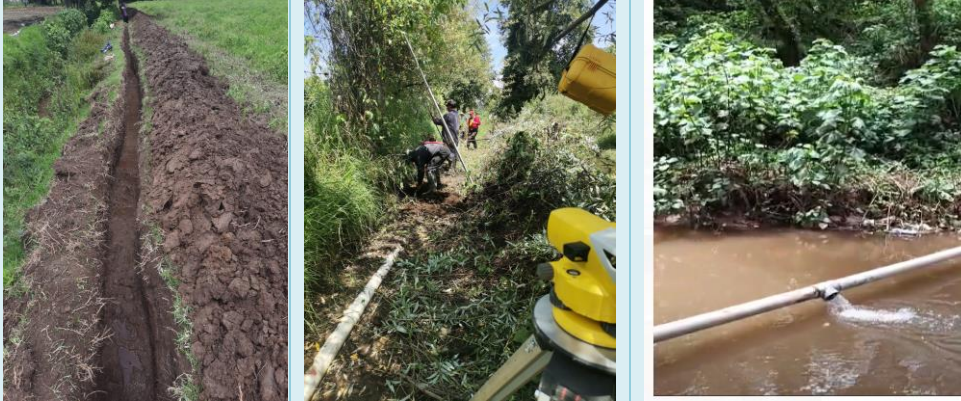
FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	3/04/2023								
Fecha de conclusión	30/06/2023								
Todo el municipio	El Potrero Primera Sección								
Localidad (es)	El Potrero Primera Sección								
Descripción	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	1047								
Costo	\$1,199,487.62								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(x)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	20								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	10	9	10	0	
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									


FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	4/07/2023								
Fecha de conclusión	29/09/2023								
Todo el municipio	Rincón de Guadalupe Cuarta Sección (El Tejocote)								
Localidad (es)	Rincón de Guadalupe Cuarta Sección (El Tejocote)								
Descripción	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en paraje el puerto a El Tejocote								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	450								
Costo	\$598,817.80								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(X)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(X)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	20								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	10	9	10	0	
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									

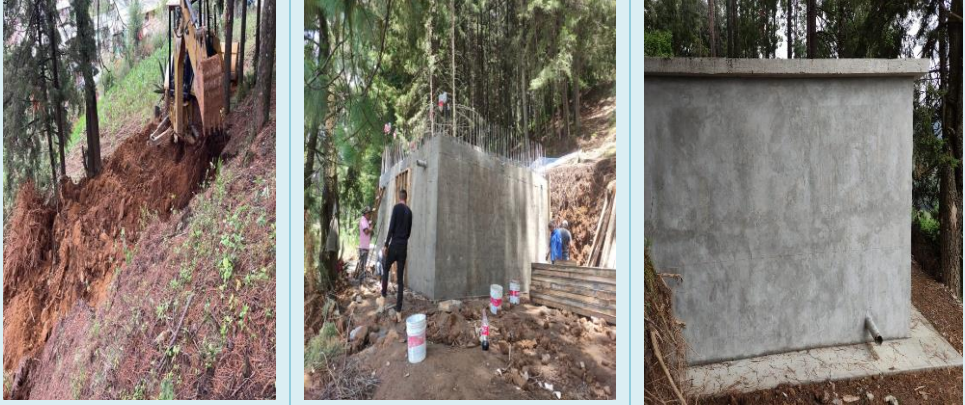
FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)							
Fecha de inicio	4/07/2023							
Fecha de conclusión	29/08/2023							
Todo el municipio	San Bartolo Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sección							
Localidad (es)	San Bartolo Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sección							
Descripción	Construcción de Sistema de Agua Potable para San Bartolo Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sección							
Meta	Incrementar el servicio de agua potable en localidades el Municipio.							
Beneficiarios	2980							
Costo	\$2,499,627.48							
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas							
Unidad de medida			Obra	(x)				
			Acción	()				
			Documento	()				
Tipo de Actividad	Compromiso		()					
	Demanda Social		()					
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()					
	Obra Pública en proceso		()					
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)					
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial ()	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()	
Línea de acción a vincular	Incrementar el servicio de agua potable en localidades el Municipio.							
Avance Porcentual	100%							
Cantidad Programada anual	4							
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada
	0	0	0	0	2	2	2	2
Descripción del Avance	Se realizaron trabajos de servicios básicos de agua potable en benéfico de la población							
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)								


FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	6/04/2023								
Fecha de conclusión	9/06/2023								
Todo el municipio	San Bartolo Quinta Sección (Polvillos)								
Localidad (es)	San Bartolo Quinta Sección (Polvillos)								
Descripción	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino de la Escuela Primaria								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	480								
Costo	\$649,883.96								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(x)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (X)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	20								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	10	9	10	0	
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									


FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN SOLICITADA								
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	17/07/2023								
Fecha de conclusión	8/09/2023								
Todo el municipio	San Jerónimo Tercera Sección								
Localidad (es)	San Jerónimo Tercera Sección								
Descripción	Construcción de tanque de agua potable								
Meta	Incrementar el servicio de agua potable en localidades el Municipio.								
Beneficiarios	700								
Costo	\$849,981.69								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(x)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Incrementar el servicio de agua potable en localidades el Municipio.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	4								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	2	2	2	2	
Descripción del Avance	Se realizaron trabajos de servicios básicos de agua potable en benéfico de la población								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									

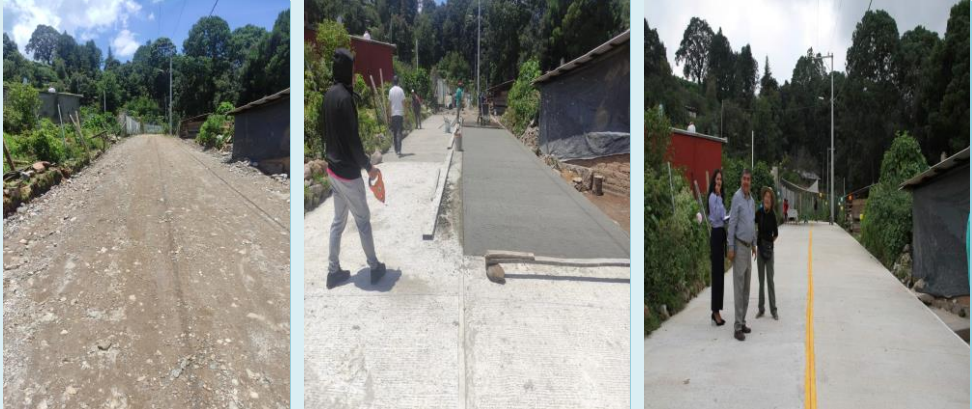
FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)							
Fecha de inicio	31/07/2023							
Fecha de conclusión	22/09/2023							
Todo el municipio	San Juan Primera Sección							
Localidad (es)	San Juan Primera Sección							
Descripción	Rehabilitación de camino a base de revestimiento del campo de futbol al tanque de agua potable							
Meta	Pavimentación de calles							
Beneficiarios	1200							
Costo	\$599,828.59							
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas							
Unidad de medida	Obra		(x)		Acción		()	
					Documento		()	
Tipo de Actividad	Compromiso		()		Demanda Social		()	
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()		Obra Pública en proceso		()	
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)					
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()	
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.							
Avance Porcentual	100%							
Cantidad Programada anual	5							
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada
	0	0	0	0	2	2	3	2
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades							
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)								


FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	3/04/2023								
Fecha de conclusión	16/06/2023								
Todo el municipio	San Juan Segunda Sección								
Localidad (es)	San Juan Segunda Sección								
Descripción	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico a la Palma								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	900								
Costo	\$599,871.96								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(x)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	20								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	10	9	10	0	
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									


FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	3/07/2023								
Fecha de conclusión	1/09/2023								
Todo el municipio	San Juan Tercera Sección								
Localidad (es)	San Juan Tercera Sección								
Descripción	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico hacia la barranca								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	1500								
Costo	\$599,809.74								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(x)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	20								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	10	9	10	0	
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									


FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)							
Fecha de inicio	4/04/2023							
Fecha de conclusión	15/06/2023							
Todo el municipio	San Juan (El Temporal)							
Localidad (es)	San Juan (El Temporal)							
Descripción	Construcción de aula y trabajos complementarios en Telebachillerato							
Meta	Construcción de infraestructura educativa medio superior							
Beneficiarios	150							
Costo	\$898,436.01							
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas							
Unidad de medida	Obra		(x)		Acción		()	
					Documento		()	
Tipo de Actividad	Compromiso		()		Demanda Social		()	
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()		Obra Pública en proceso		()	
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)					
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial ()	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()	
Línea de acción a vincular	Contribuir a mejorar los servicios de educación mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa							
Avance Porcentual	100%							
Cantidad Programada anual	1							
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada
	0	0	0	0	0	0	1	2
Descripción del Avance	Se realizó la infraestructura beneficiando a los alumnos para sus actividades escolares							
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)								


FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	20/06/2023								
Fecha de conclusión	1/09/2023								
Todo el municipio	San Lucas Cuarta Sección, San Francisco								
Localidad (es)	San Lucas Cuarta Sección, San Francisco								
Descripción	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de camino de la joya a los camachos								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	368								
Costo	\$499,801.08								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(x)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	20								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	10	9	10	0	
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									


FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	3/04/2023								
Fecha de conclusión	16/06/2023								
Todo el municipio	San Mateo Primera Sección								
Localidad (es)	San Mateo Primera Sección								
Descripción	Construcción de guarniciones y banquetas en camino principal								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	1400								
Costo	\$799,302.84								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(x)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	1								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	0	0	1	2	
Descripción del Avance	Se realizaron para que las personas tengan mejor desplazamiento peatonal de un destino a otro								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									


FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	04/04/2023								
Fecha de conclusión	30/06/2023								
Todo el municipio	San Mateo Segunda Sección								
Localidad (es)	San Mateo Segunda Sección								
Descripción	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de camino en paraje Agua Zarca								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	450								
Costo	\$799,325.72								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(x)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	20								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	10	9	10	0	
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									

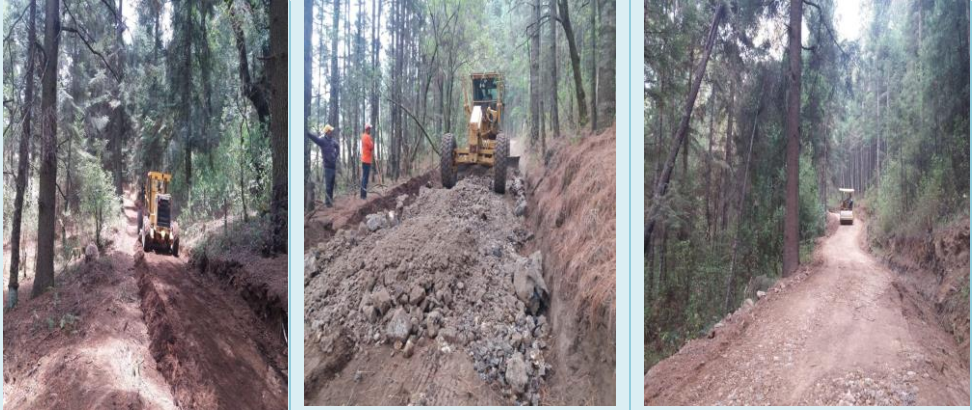
FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)							
Fecha de inicio	31/07/2023							
Fecha de conclusión	22/09/2023							
Todo el municipio	San Mateo Cuarta Sección (Pueblo nuevo)							
Localidad (es)	San Mateo Cuarta Sección (Pueblo nuevo)							
Descripción	Construcción de plaza cívica en el Telebachillerato Comunitario Num. 45							
Meta	Construcción de infraestructura educativa medio superior							
Beneficiarios	600							
Costo	\$499,433.85							
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas							
Unidad de medida	Obra (x) Acción () Documento ()							
Tipo de Actividad	Compromiso () Demanda Social () Proyecto o Acción de Alto Impacto () Obra Pública en proceso () Obra o acción nueva o fuera del PDM (x)							
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social (x)	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial ()	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()	
Línea de acción a vincular	Contribuir a mejorar los servicios de educación mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.							
Avance Porcentual	100%							
Cantidad Programada anual	1							
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada
	0	0	0	0	0	0	1	2
Descripción del Avance	Se realizó la infraestructura beneficiando a los alumnos para sus actividades escolares							
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)								

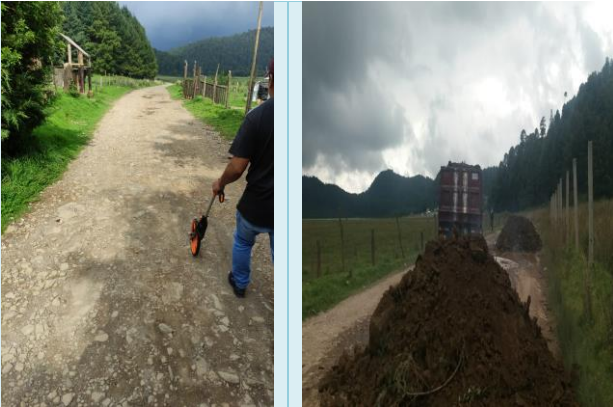
FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	29/03/2023								
Fecha de conclusión	28/04/2023								
Todo el municipio	San Mateo Primera Sección								
Localidad (es)	San Mateo Primera Sección								
Descripción	Apertura y revestimiento de camino de San Mateo en paraje La Joya								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	2000								
Costo	\$1,498,839.94								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(x)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	5								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	2	2	3	2	
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									

FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)							
Fecha de inicio	29/03/2023							
Fecha de conclusión	28/04/2023							
Todo el municipio	El Potrero Tercera Sección							
Localidad (es)	El Potrero Tercera Sección							
Descripción	Rehabilitación de camino a base de revestimiento del potrero Tercera sección a el Ejido del Potrero							
Meta	Pavimentación de calles							
Beneficiarios	1000							
Costo	\$1,198,840.02							
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas							
Unidad de medida	Obra		(x)		Acción		()	
					Documento		()	
Tipo de Actividad	Compromiso		()		Demanda Social		()	
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()		Obra Pública en proceso		()	
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)					
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()	
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.							
Avance Porcentual	100%							
Cantidad Programada anual	5							
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada
	0	0	0	0	2	2	3	2
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades							
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)								

FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	29/03/2023								
Fecha de conclusión	28/04/2023								
Todo el municipio	Capilla Vieja								
Localidad (es)	Capilla Vieja								
Descripción	Rehabilitación de camino principal a base de revestimiento de Capilla Vieja a Corral de Piedra								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	600								
Costo	\$1,198,781.90								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida			Obra	(x)					
			Acción	()					
			Documento	()					
Tipo de Actividad	Compromiso		()						
	Demanda Social		()						
	Proyecto o Acción de Alto Impacto		()						
	Obra Pública en proceso		()						
	Obra o acción nueva o fuera del PDM		(x)						
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	5								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	2	2	3	2	
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)									

FORMATO DE REQUISICIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDM

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN SOLICITADA							
Año	Año fiscal (2023)								
Fecha de inicio	3/07/2023								
Fecha de conclusión	1/08/2023								
Todo el municipio	San Sebastián Grande Segunda Sección								
Localidad (es)	San Sebastián Grande Segunda Sección								
Descripción	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de camino en paraje Taxi joy								
Meta	Pavimentación de calles								
Beneficiarios	300								
Costo	\$799,851.60								
Área responsable o ejecutora	Dirección de Obras Públicas								
Unidad de medida	Obra () Acción () Documento ()								
Tipo de Actividad	Compromiso () Demanda Social () Proyecto o Acción de Alto Impacto () Obra Pública en proceso () Obra o acción nueva o fuera del PDM ()								
Pilar o Eje del Plan de Desarrollo Municipal	Pilar 1 Social ()	Pilar 2 Económico ()	Pilar 3 Territorial (x)	Pilar 4 Seguridad ()	Eje I ()	Eje II ()	Eje III ()		
Línea de acción a vincular	Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio municipal, como un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad.								
Avance Porcentual	100%								
Cantidad Programada anual	20								
Cantidad realizada	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	Programada	Alcanzada	
	0	0	0	0	10	9	10	0	
Descripción del Avance	Se realizaron los trabajos para tener mejor conexión vial entre las localidades								
Evidencia fotográfica (formato jpg, 200 kb máx.)	
